



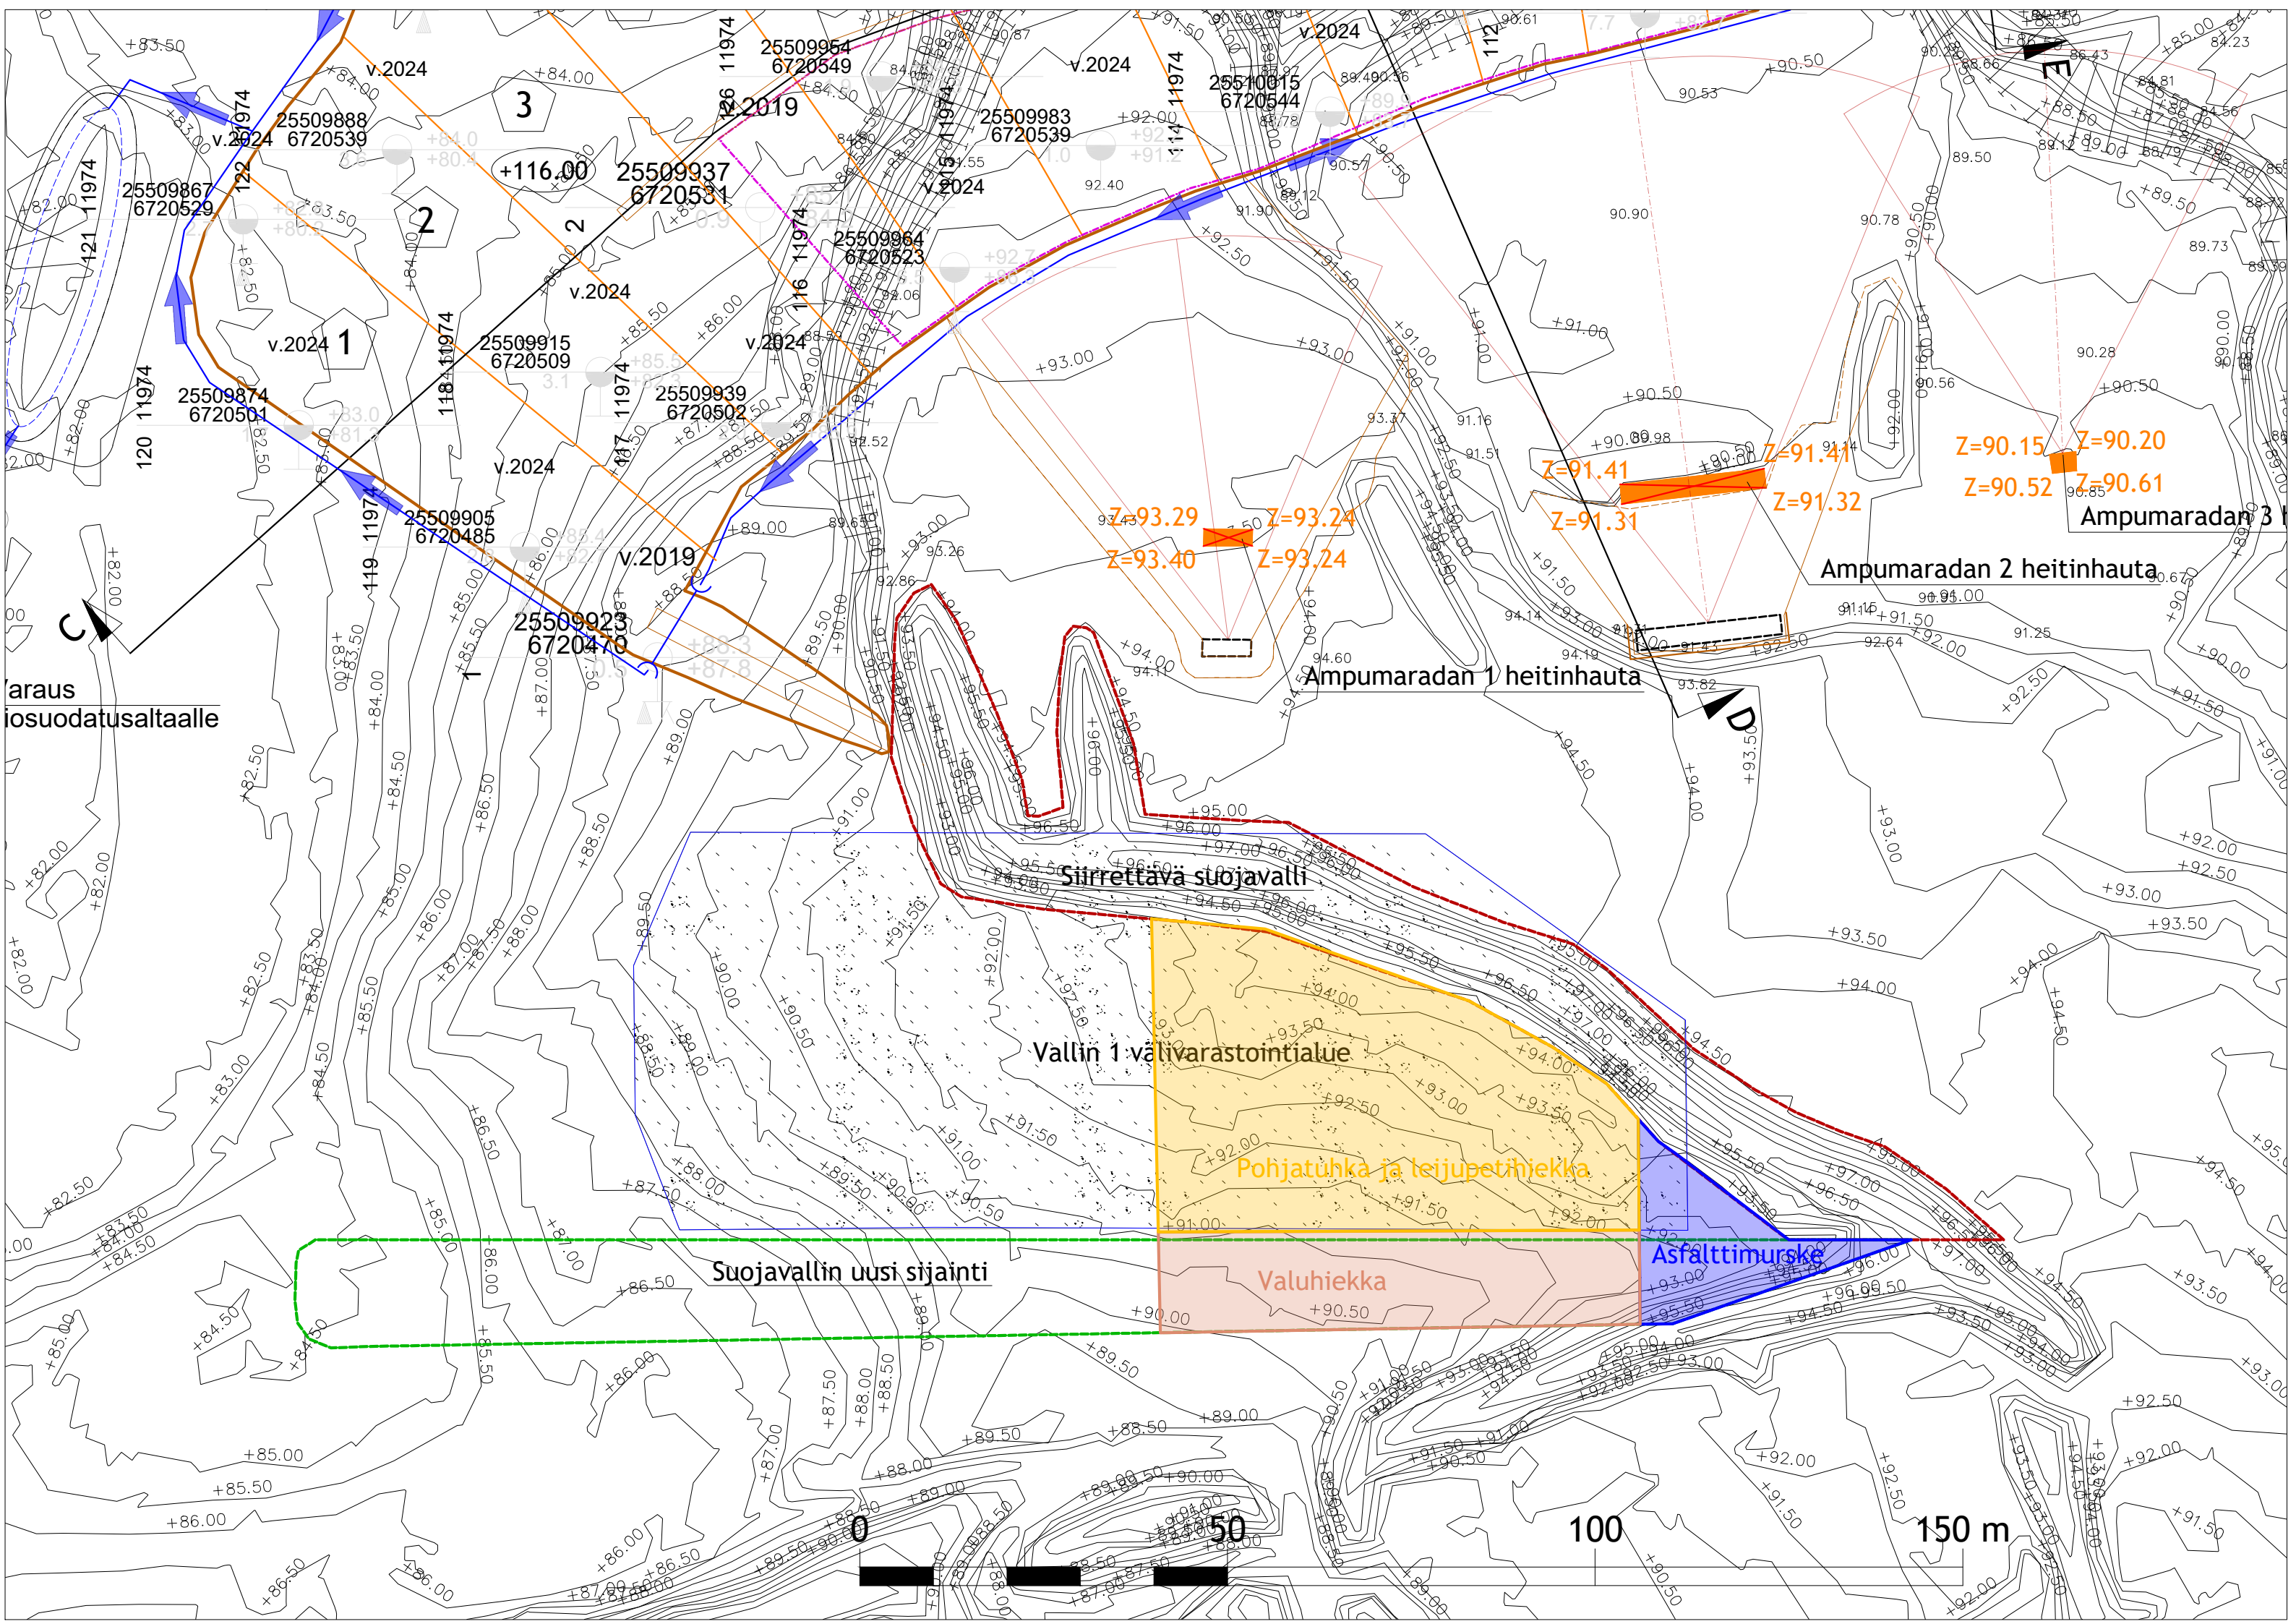

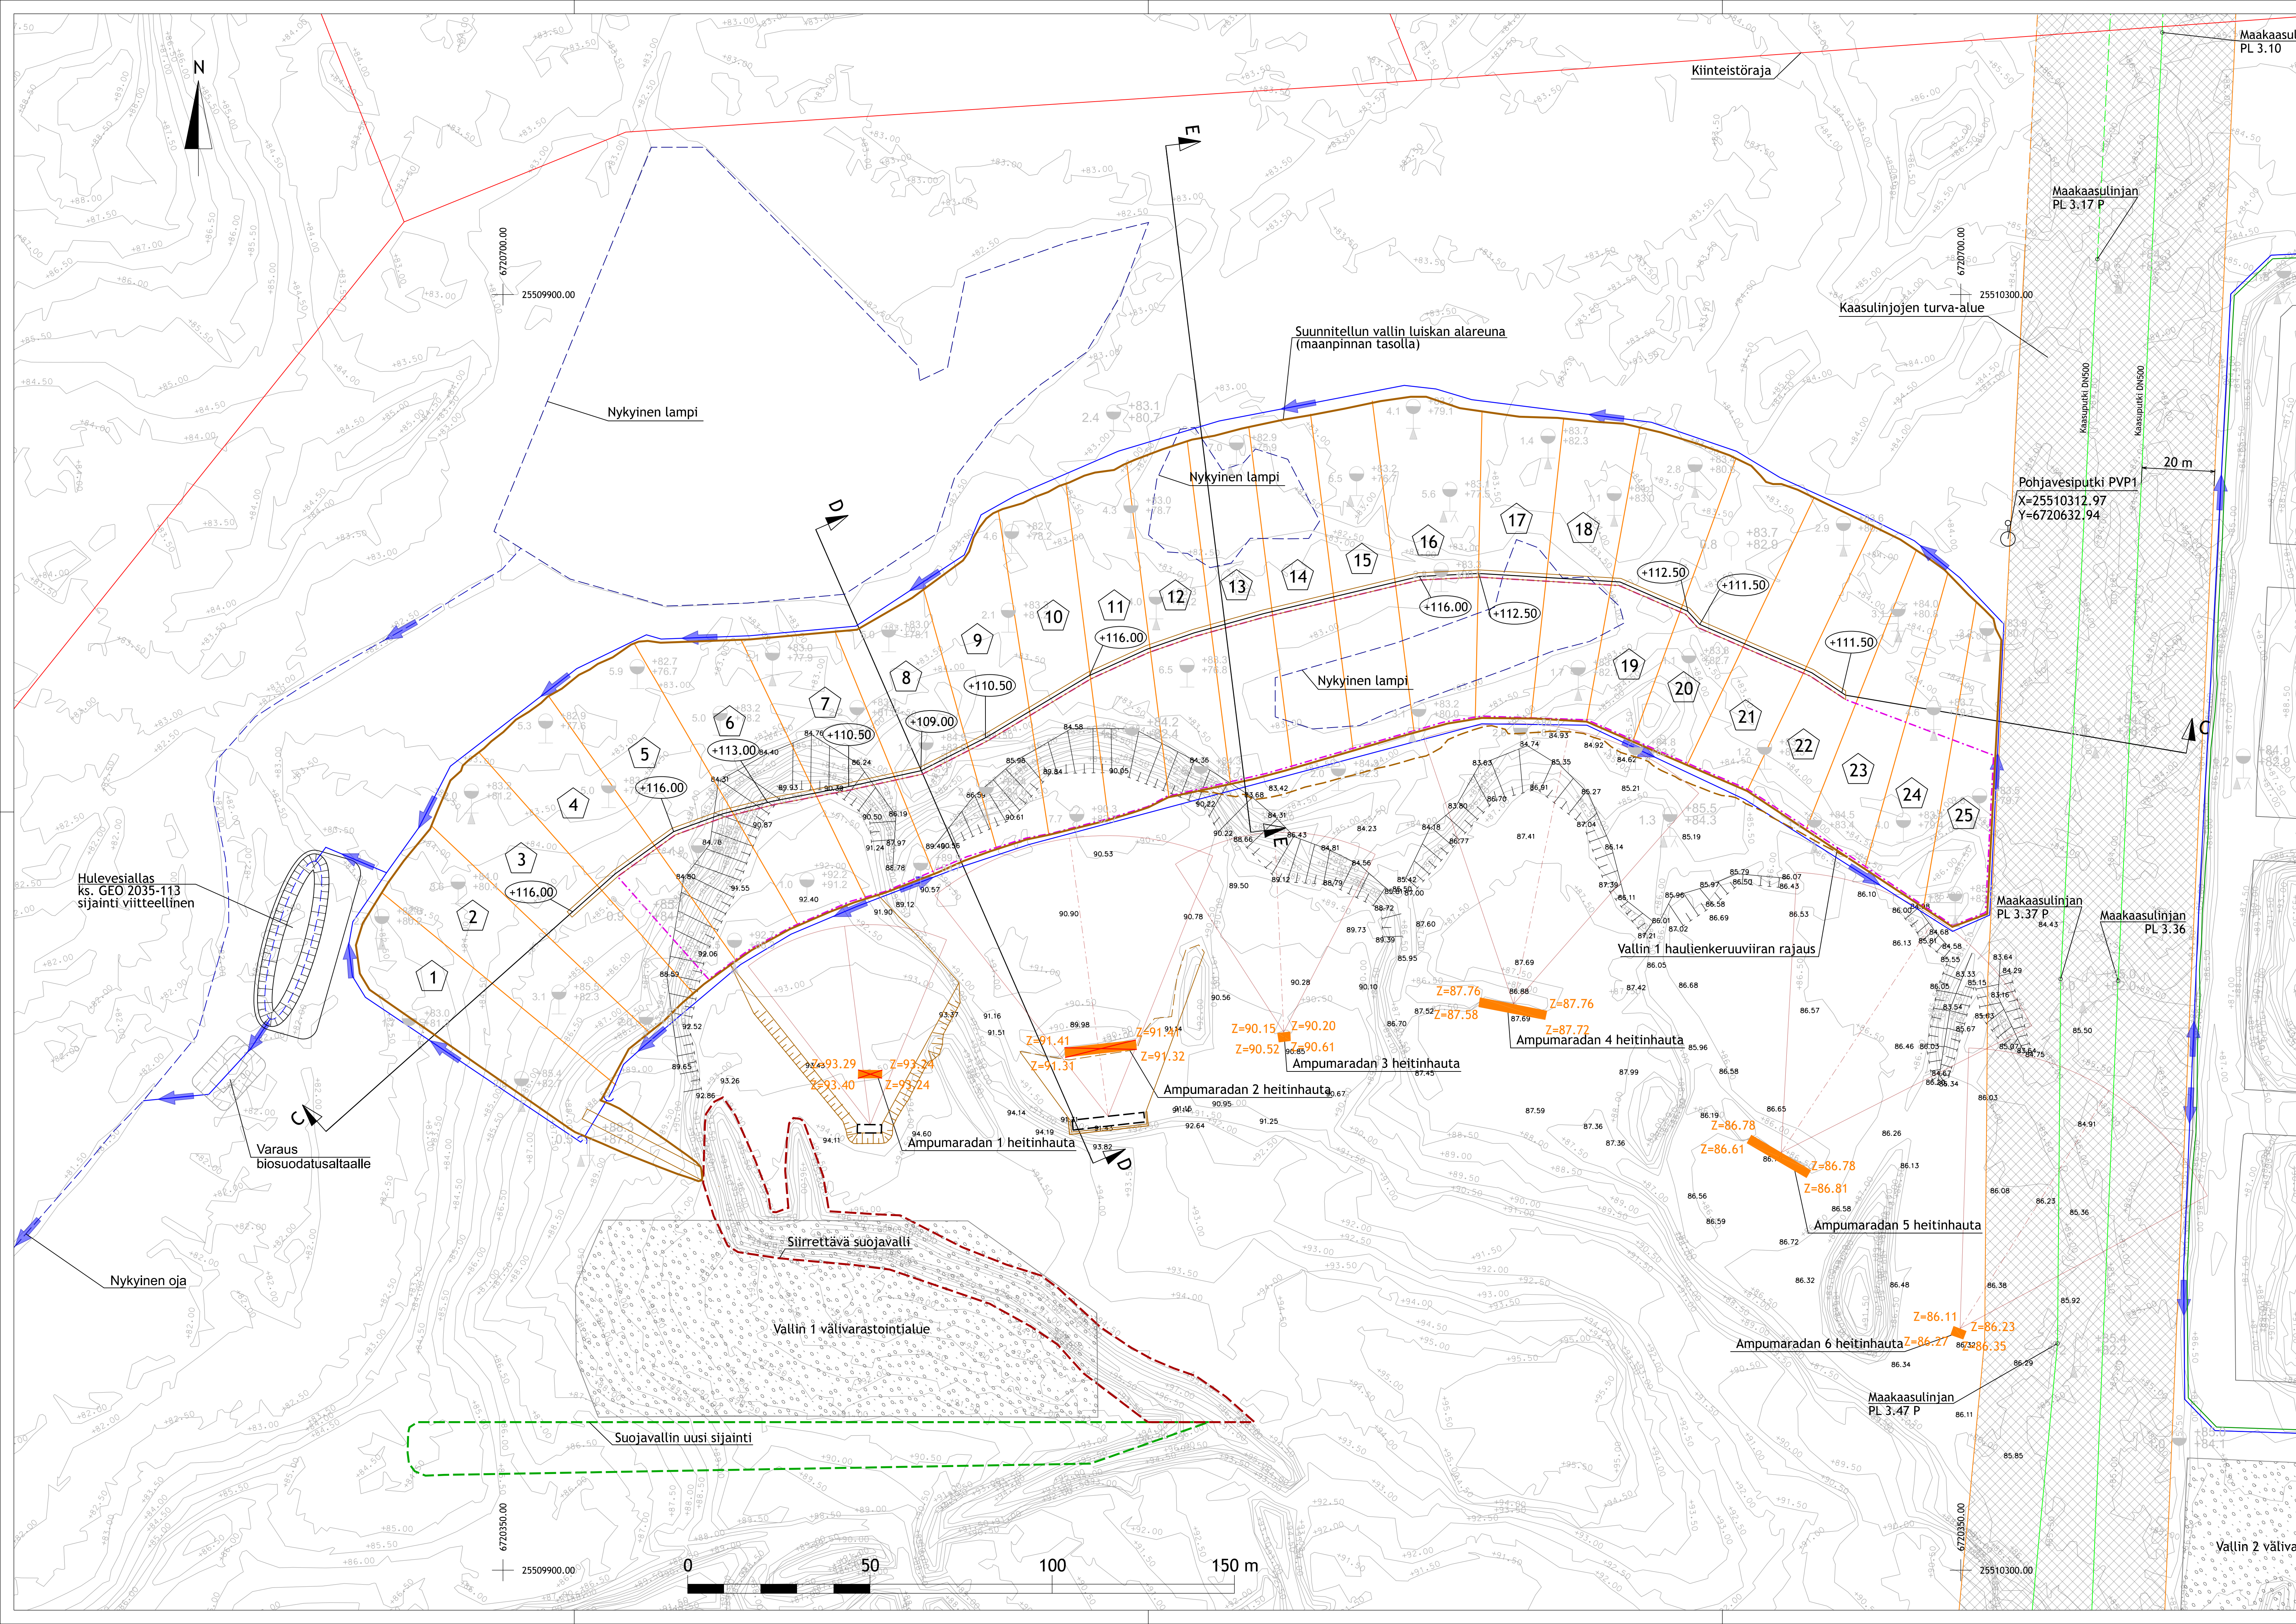

Merkinnät:

83.50 Maanpinnan korkeuskäyrät 0,5 m välein maanmittauslaitoksen vuoden 2023 laserkeilausaineiston perusteella (N2000)

86.65 Mitattu maanpinnan korkeustaso (v.2019, N2000)

Kaasulinjojen turva-alue

1 Vallin lohkon numero

Hautienkeruuviran tai vastaavan rakenteen raja

Valli on jaettu 25 lohkoksi, joiden avulla voidaan rajata mitkä alueet ovat milloinkin työn alla. Tämän avulla voidaan ohjata mitkä ampumaratat täytyy sulkea ja mitkä voi olla käytössä eri rakennusvaiheissa.

Viereisessä taulukossa on esitetty mihin lohkiin eri ampumaradasta voi päätyä hauleja.

x = hauleja voi päätyä lohkon alueelle ampumaradalta

o = hauleja ei voi päätyä lohkon alueelle ampumaradalta

Vaiheistusvaihtoehto 1:

Vaihe 1: Lohkot 1-4 työn alla, kaikki ampumaratat avoinna

Vaihe 2: Lohkot 1-6 työn alla, ampumaratat 1 suljettu

Vaihe 3: Lohkot 1-8 työn alla, ampumaratat 1 ja 2 suljettu

Vaihe 4: Lohkot 1-14 työn alla, ampumaratat 1, 2 ja 3 suljettu

Vaihe 5: Lohkot 12-20 työn alla, ampumaratat 2, 3 ja 4 suljettu

Vaihe 6: Lohkot 16-24 työn alla, ampumaratat 3, 4 ja 5 suljettu

Vaihe 7: Lohkot 18-25 työn alla, ampumaratat 4, 5 ja 6 suljettu

Vaihe 8: Lohkot 23-25 työn alla, ampumaratat 5 ja 6 suljettu

Vallin rakentaminen voidaan pysäyttää tarvittaessa tietyillä alueilla ja estää väliaikaisella suojauksella haulien pääsy rakennusmaiden sekaan. Väliaikainen suojaus voidaan tehdä esimerkiksi asentamalla rakennettua alueen päälle suodatinkangas- tai viiraverhoitu. Rakentamisen jatkuessa, suodatinkankaat tai viirat kerätään pois hallitusti niin, että niiden päälle mahdollisesti päätyneet haulit saadaan talteen.

Lohko	Ampumaratat					
	1	2	3	4	5	6
1	o	o	o	o	o	o
2	o	o	o	o	o	o
3	o	o	o	o	o	o
4	o	o	o	o	o	o
5	x	o	o	o	o	o
6	x	o	o	o	o	o
7	x	x	o	o	o	o
8	x	x	o	o	o	o
9	x	x	x	o	o	o
10	x	x	x	o	o	o
11	x	x	x	o	o	o
12	o	x	x	o	o	o
13	o	x	x	o	o	o
14	o	x	x	o	o	o
15	o	x	x	x	o	o
16	o	o	x	x	o	o
17	o	o	x	x	o	o
18	o	o	o	x	o	o
19	o	o	o	x	o	o
20	o	o	o	x	o	o
21	o	o	o	x	x	o
22	o	o	o	x	x	o
23	o	o	o	o	x	o
24	o	o	o	o	x	o
25	o	o	o	o	x	x

Rev.	Setite	Päivämäärä	Tekijä
I	Välivarastoalue tarkennettu	4.8.2025	A. Kivinen
H	Välivarastoalue ja sen lähistöllä oleva suojavalli siirretty	16.5.2025	A. Kivinen
G	Hulevesioja lisäty kiertämään vallin länsipuolelta	26.2.2025	A. Kivinen
F	Hulevesiallan sijainti muutettu	10.1.2025	A. Kivinen
E	Hulevesiallan sijainti muutettu	19.11.2024	A. Kivinen
D	Hulevesiojan linjausta muutettu	28.10.2024	A. Kivinen
C	Vallin linjausta muutettu, lisäty lammen turva-alue	1.2.2024	A. Kivinen
B	Hautienkeruuviran rajausta lisäty, hulevesiallasta suurennettu	29.1.2021	A. Kivinen
A	Varaus biosuodatusaltaalle ja nykyinen laskuoja lisäty	4.8.2020	A. Kivinen
Kuvaus/Rev. Korteittu/Tila Toimitus/Renno Viranomaisen merkintöjä varten			
Hirvihaara			
Rakennusohjelmanpide			
-			
Tilaaja, rakennuskohteen nimi ja osoite		Koordinaattijärjestelmä	Korkeusjärjestelmä
Kreate Oy		ETRS-GK25	N2000
Hirvihaaran ampumaratat		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Vallien suunnittelu		Valli 1, Asemapiirustus	1:750
Hirvihaarantie 725, 04680 Mäntsälä			
Suunnittelija/Piirtäjä		Työnumero	Piirustuksen numero
A. Kivinen			
Vastaava suunnittelija			
A. Kivinen			
Yhteyshenkilö			
A. Kivinen			
GeoPro Consulting Oy		Päivämäärä	Tiedosto
Eliel Saarisen tie 2 B, 00400 Helsinki		4.6.2020	
esim.matti.suominen@gpc.fi			
www.gpc.fi			
